СМР за ПБ "ВИДИМА"-сграда спален блок

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

№	ВИД ДЕЙНОСТ	М-ка	К-во	Брой календарни дни
	ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА ЗА СМР			1
	Спални помещения:			
1.	ДЕМОНТАЖ НА ДЮШЕМЕ ВЪРХУ СТОМАНОБЕТ. ПЛОЧА С ДЕБ. НА ДЪСКИТЕ 4 СМ. (САМО ТРУД)	$м^2$	310	8
2.	РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦ. ОТ ТЕРАКОТА НА ЦИМ. РАЗТВОР	$м^2$	59	3
3.	ГРУНДИРАНЕ НА ПОДОВЕ ПРИ РЕМОНТИ	$м^2$	384	4
4.	УНИВЕРСАЛНА ЗАМАЗКА ОТ СУХА СМЕС	$м^2$	74	4
5.	НАСТИЛКА ОТ ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО	$м^2$	384	7
6.	МОНТАЖ НА ПЕРВАЗИ ОТ PVC ПРИ РЕМОНТИ	м	370	5
7.	СВАЛЯНЕ НА СТАРА ВЪТР. МАЗИЛКА СЪС СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ	$м^2$	300	14
8.	ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД	$м^2$	194	3
9.	ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ПО ТУХЛ. СТЕНИ	$м^2$	95	5
10.	ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ПО БЕТОННИ ТАВАНИ	$м^2$	70	3
11.	ВЪТРЕШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМ. МАЗИЛКА ПО ТУХЛ. СТЕНИ, ЕДНОПЛАСТОВА, ПРИ РЕМОНТИ	$м^2$	29	2
12.	ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ВЪРХУ МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТ	$м^2$	312	6
13.	ШПАКЛОВКА С ГОТОВА СМЕС ПРИ РЕМОНТИ	$м^2$	352	10
14.	ГРУНДИРАНЕ НА СТАРИ СТЕНИ С ЛАТЕКСОВ ГРУНД	$м^2$	1641	10
15.	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ДВУКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ	$м^2$	1641	16
II.	**Санитарни възли:**			
1.	ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ ½"	м	10	1
2.	ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ ¾"	м	10	1
3.	ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1"	м	10	1
4.	СМЯНА КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ ОТКРИТИ, ВЕРТИКАЛНИ, ВИСЯЩИ ПРИ СТАРА КАНАЛИЗАЦИЯ	м	32	3
5.	ДЕМОНТАЖ САМОСТОЯТЕЛЕН ФИТИНГ В СЪЩЕСТВУВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ 1/2", 3/4", И 1" И 1	бр.	40	1
6.	ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА - СТОЯЩА С И БЕЗ ПОДВИЖЕН ДУШ 1/2"	бр.	20	3
7.	РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦ. ОТ ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО	$м^2$	95	3
8.	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА С ЛЕПИЛО ПО СТЕНИ - ФУГА 2 мм.	$м^2$	95	5
9.	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 20 - СТУД. ВОДА	м	32	4
10.	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 20 - ТОПЛА ВОДА	м	32	3
11.	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 25 - СТУД. ВОДА	м	10	2
12.	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 32 - СТУД. ВОДА	м	10	2
13.	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 40 - СТУД. ВОДА	м	10	2
14.	PVC ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 110/2.2	м	33	2
15.	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ НА ЛЕПИЛО	$м^2$	40	6
16.	ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ МЕТАЛНА ИЛИ ДЪРВЕНА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ (СУХА МАЗИЛКА)	м	28	2
17.	ШПАКЛОВКА С ГОТОВА СМЕС ПРИ РЕМОНТИ	$м^2$	140	6
18.	ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД	$м^2$	140	4
19.	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ДВУКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ	$м^2$	140	7
	ПОЧИСТВАНЕ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ			3

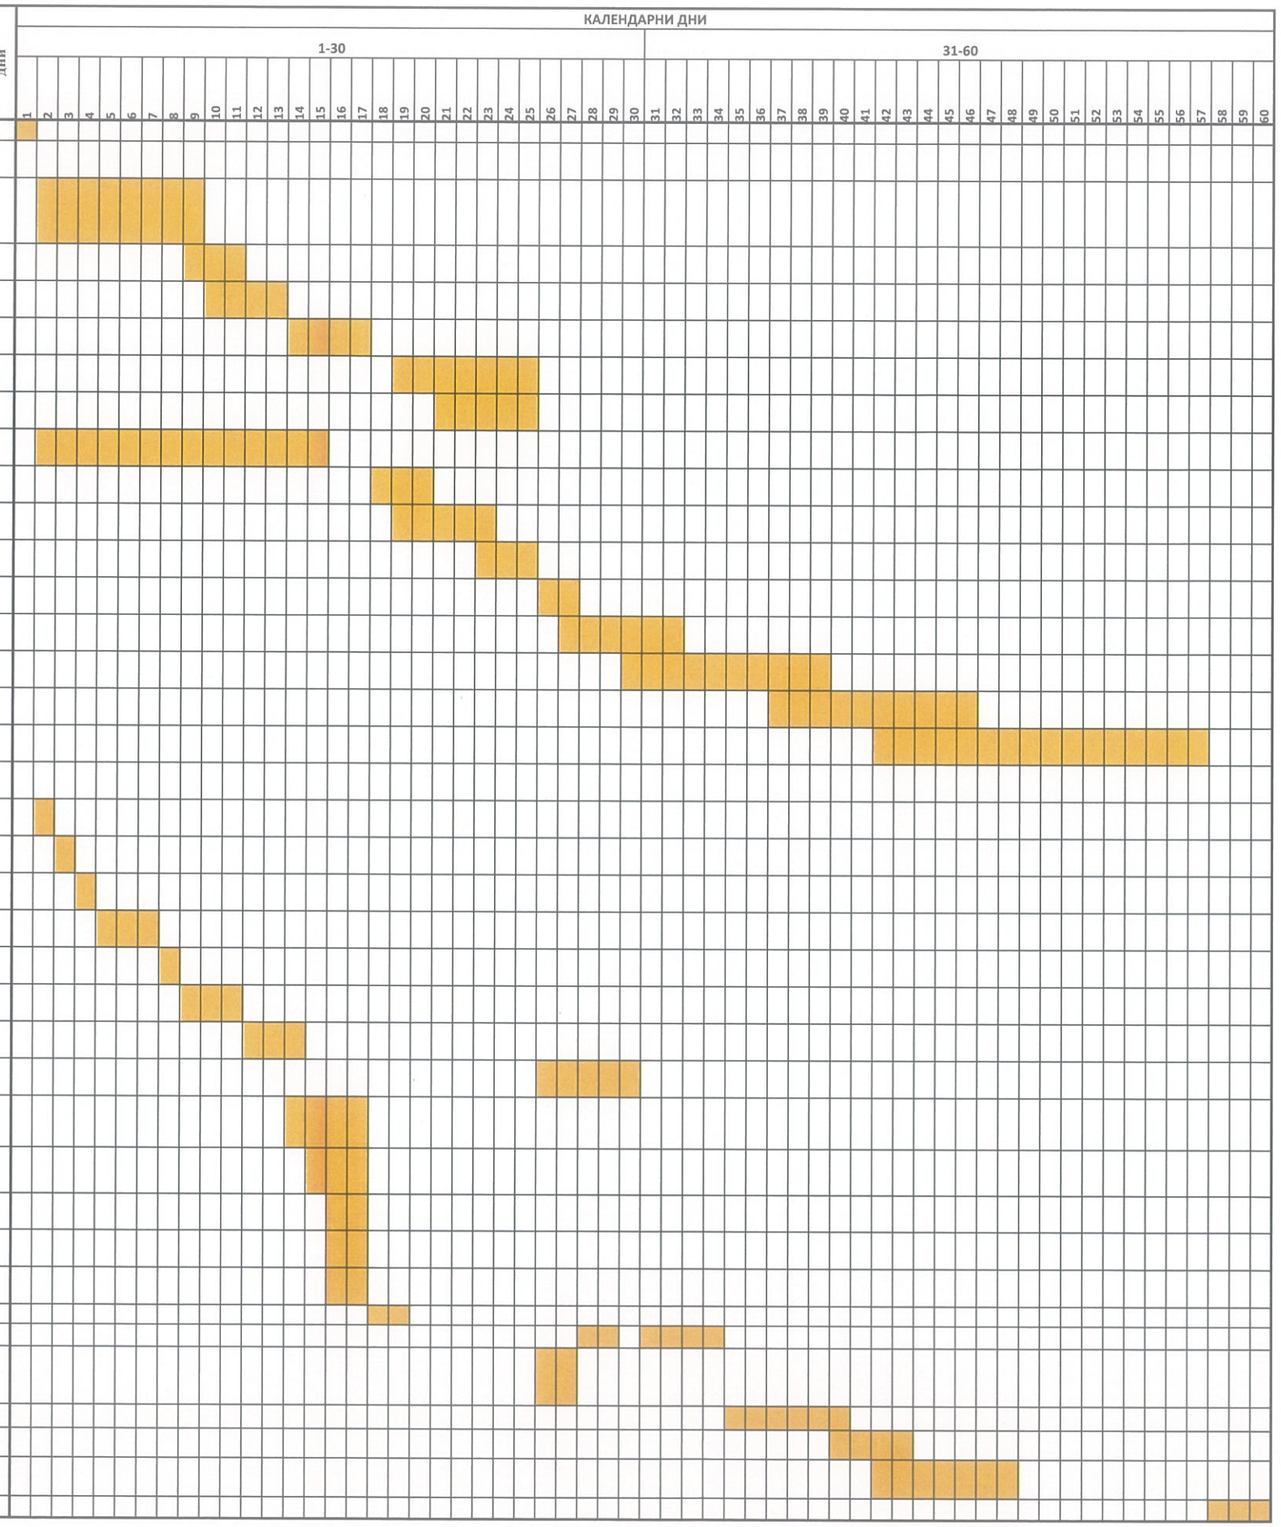

Чл. 37 от ЗОП

Чл. 37 от ЗОП

Чл. 37 от ЗОП

Управител:

Чл. 37 от ЗОП

ЕООД
