ИЗПЪЛНИТЕЛ: "БО БИЛД", ЕИК 203290856

за обект

СМР за ПБ "КРАНЕВО"

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

№	ВИД ДЕЙНОСТ	М-ка	К-во	Брои календарни дни
	ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА ЗА СМР			2
1	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ДОГРАМА - / т.Б - I-1 от Ц.П./	м2	67.65	6
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ - / т.Б - I- 5 от Ц.П./	м2	44.55	6
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ - / т.Б - I- 9 от Ц.П./	м2	23.1	4
4	СКАРА ОТ ИГЛОЛИСТНИ БИЧМЕТА ЗА ЗАХВ. НА ОБШИВКИ - / т. VIII-8 от Ц.П./	м2	613.8	39
5	ЛАМПЕРИЯ ОТ ПРЕС. ПЛОСКОСТИ С ФУРНИР ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ В/У ГОТОВА ОСНОВА - / т. VIII-11 от Ц.П./	м2	198	29
6	ЛАМПЕРИЯ ОТ ЛАМИНИРАНИ ПЛОСКОСТИ - / т. VIII-12 от Ц.П./	м2	415.8	39
7	МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ ЗА ОБИКН. СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ - / т. XX-102 от Ц.П./	бр	33	5
8	МОНТАЖ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА ОБТЯЖКА - / т. XX-107 от Ц.П./	бр	22	3
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ - / т.Б - I-9 от Ц.П./	м2	11.5	2
10	БОЯДИСВАНЕ НА РЕЛЕФНИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 m С ФАСАГЕН ДВУКРАТНО - / т. XIII -40 от Ц.П./	м2	66	4
11	ГРУНДИРАНЕ С АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД ПРИ РЕМОНТИ - / т. XIII -43 от Ц.П./	м2	60	4
12	БЛАЖНА БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ - / т. XIII - 74 от Ц.П./	м2	759	39
13	МОНТАЖ НА ГОТОВИ ВИСЯЩИ ОЛУЦИ - / т. VII - 13 от Ц.П./	мл	66	4
14	БОЯДИСВАНЕ НА РЕЛЕФНИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 m С ФАСАГЕН ДВУКРАТНО - / т. XIII -40 от Ц.П./	м2	750	44
15	ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТРОИТ. ОТПАДЪЦИ ОТ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИК. - / т. I - 28 от Ц.П./	м3	25	5
16	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ НА 50 м И РАЗТОВАРВАНЕ НА БЕТОННИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ - / т. I - 16 от Ц.П./	м3	25	5
	ПОЧИСТВАНЕ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ			3

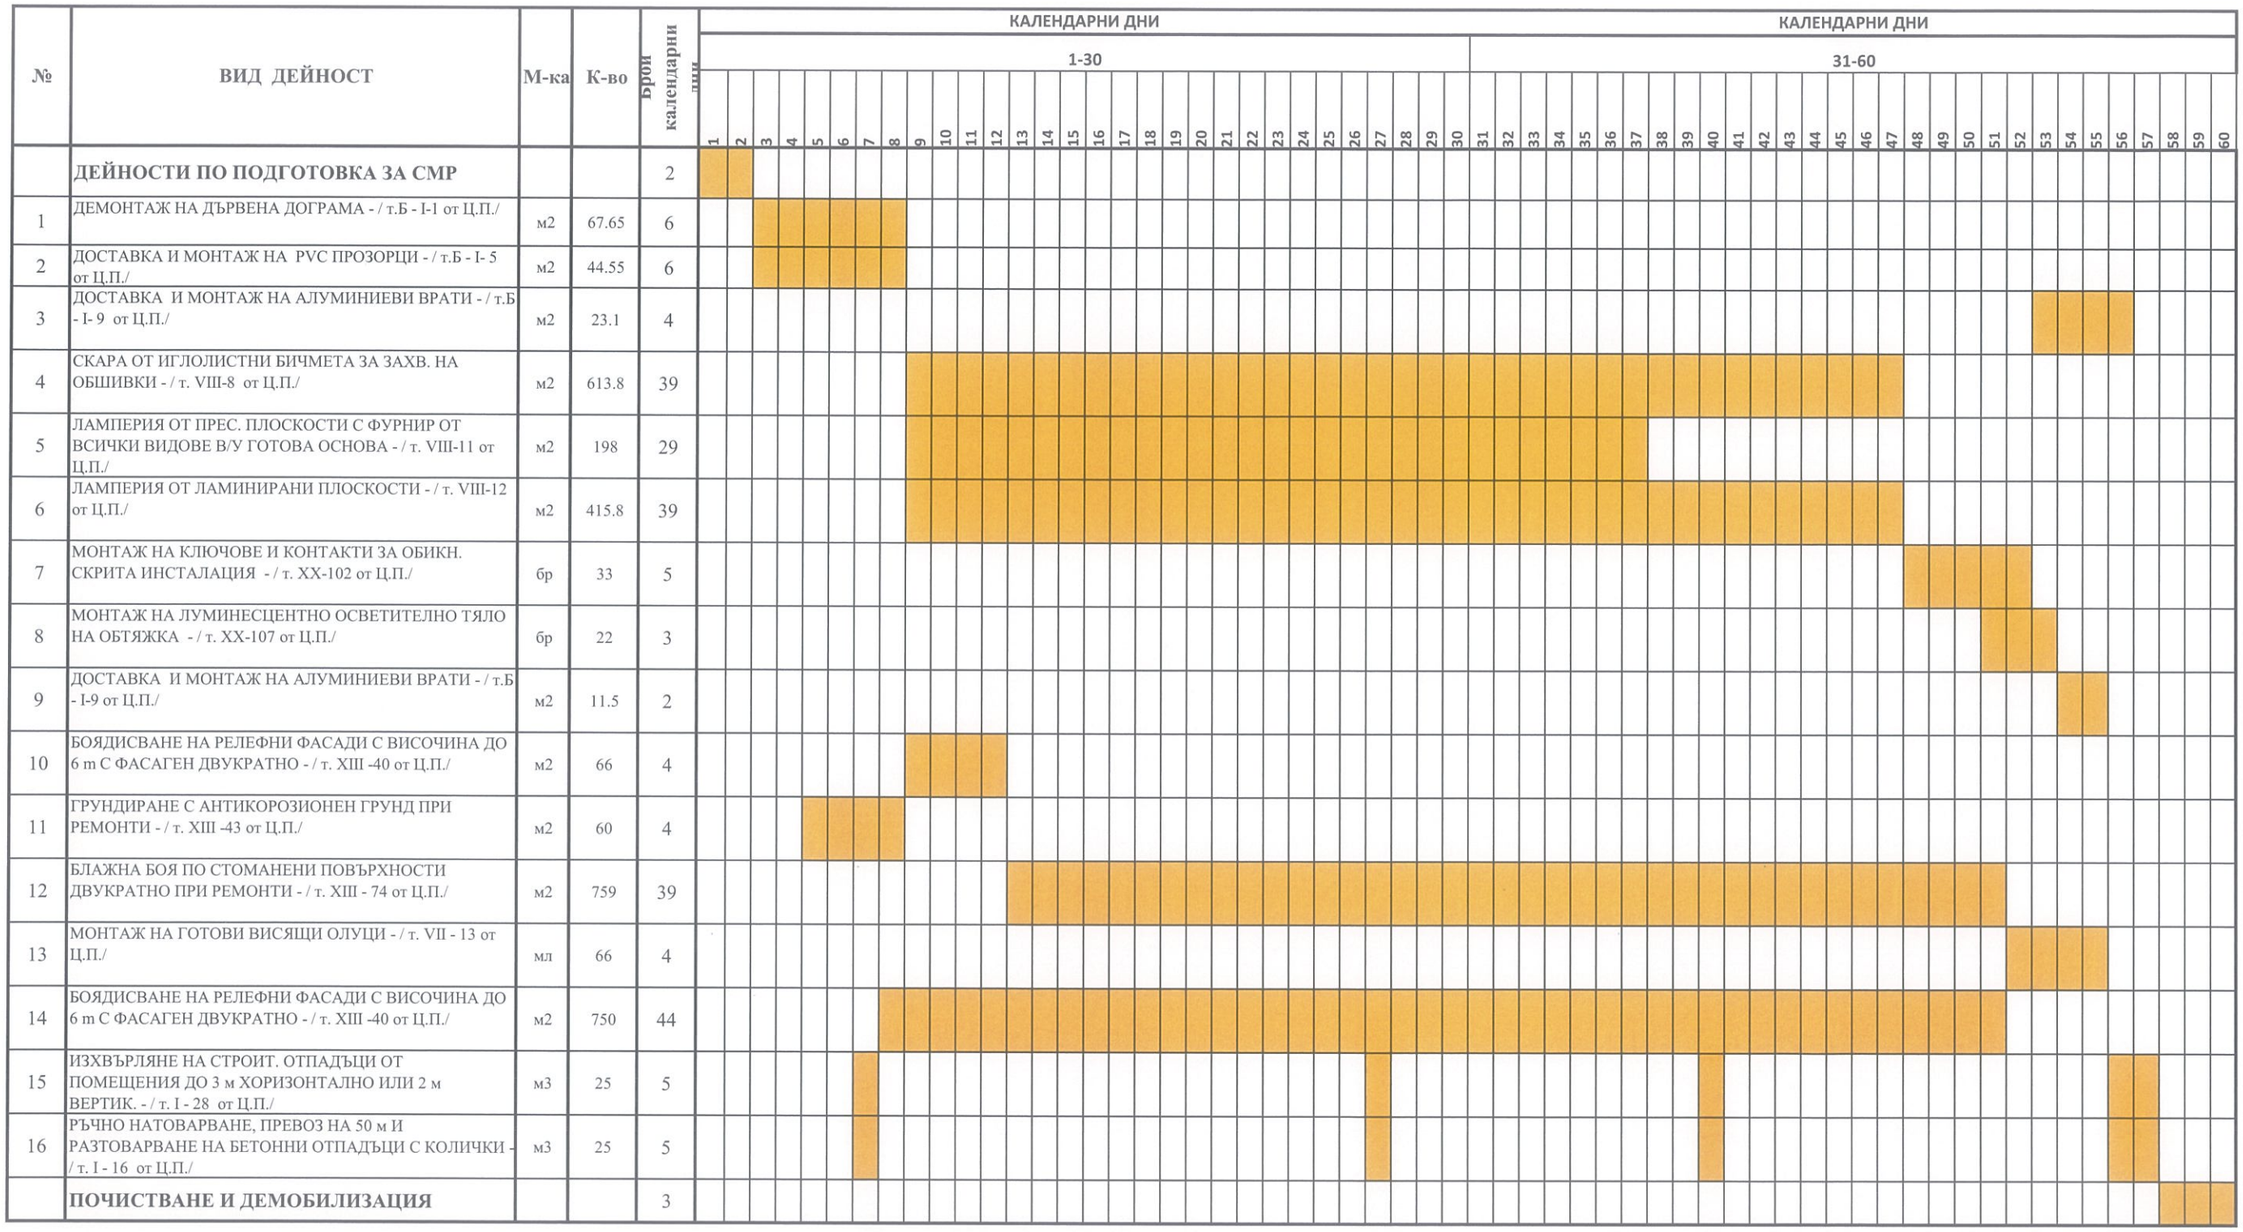

Управител:

Чл. 37 от ЗОП

Чл. 37 от ЗОП

Чл. 37 от ЗОП

Чл. 37 от ЗОП
